

شهرداری کامفیروز

عملکرد واحد نقلیه و موتوری

۱. تحویل یک دستگاه مینی لودر ، با هزینه ای بالغ بر ۳۵۰ میلیون ریال
۲. راه اندازی یک دستگاه ماشین آتش نشانی ایسوزو و تجهیز لوازم و احداث پارکینگ اختصاصی و جذب یک نفر نیروی آتش نشان
۳. تحویل یک دستگاه مینی بوس اویکو یارانه ای با هزینه ۳۵۰ میلیون ریال
۴. تحویل و راه اندازی یک دستگاه لودر ولوالم ۹۰ و جذب راننده ویژه
۵. پیگیری جهت تسهیلات خرید ماشین آلات عمرانی و جذب تسهیلات
۶. تحویل یک دستگاه برف روب و نصب لوازم مورد نیاز بر روی کامیون بنز ۱۹۲۴ با هزینه ای بالغ بر ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷. سرویس کامل ماشین آلات از قبیل گریسکاری ، سرویس هواکش و شستشو
۸. تعویض روغن ماشین آلات ، تعویض فیلتر های هوا ، گازوئیل و روغن بر حسب ساعات کارکرد و خرید گازوئیل
۹. سرویس دهی به کلیه دواير واحد ها شامل : عمرانی ، خدماتی ، فضای سبز ، اداری ، ساختمانی و تخلیفات و کارپردازی توسط ماشین آلات سنگین و سبک
۱۰. انجام امور شهروندان و اهالی بخش کامفیروز از قبیل (حفر کانال ، خاک برداری ، حمل مصالح شن و ماسه و آجر ، محصولات کشاورزی و کسب در آمدی بالغ بر ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (ششصد میلیون ریال)
۱۱. تحویل و تعویض ۶ حلقه لاستیک جهت کامیون کمپرسی آتکو و چهار حلقه لاستیک پژو ۴۰۵ و دو حلقه نیسان و دو حلقه بیل بکهو
۱۲. تعمیر کامیون بنز ۱۹۲۴ طی دو مرحله با هزینه ای بالغ بر ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۳. تعمیر موتور بیل بکهو با هزینه ای بالغ بر ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۴. تعمیر جک های فرمان جک های پایه ، کوبلینگ و شافت بیش از ۱۰ مورد با هزینه ای بالغ بر ده میلیون ریال
۱۵. تعویض ناخن ها و کفی لودر ال ۹۰
۱۶. تحویل خودرو و ماشین آلات به رانندگان طبق فرم تحویل و تحول و اخذ ضمانت و تعهد محضری جهت حفظ و نگهداری از دستگاه و ماشین آلات سنگین
۱۷. تهیه فرم گزارش روزانه ماشین آلات
۱۸. تهیه کارت سرویس و کارت و تعمیرات ماشین آلات مشترک
۱۹. حمل بیش از ۳۰ سرویس مصالح (بیس - - ۰۶ ماسه شسته) برای مساجد شهر ، دادگاه های عمومی و مساجد روستاهای محروم و خانواده ی شهدا
۲۰. سرویس دهی به واحد های اداری جهت انجام مأموریت های شهری و استانی




شهرداری کامفیروز

عملکرد واحد ساختمان، فنی و شهرسازی

- صدور بیش از ۱۵۰ عدد پروانه ساختمانی
- صدور بیش از ۵۰ مورد تمدید پروانه ساختمانی
- صدور بیش از ۲۸ مورد اصلاح پروانه ساختمانی
- صدور بیش از ۴۰ مورد عدم خلاف پروانه ساختمانی
- راه اندازی کمیسیون ماده ۱۰۰
- صدور بیش از ۳۰ مورد مجوز حصار کشی
- صدور بیش از ۱۵۰ مورد معرفی جهت نظارت و تهیه نقشه
- بیش از ۵۰۰ مورد کارشناسی اراضی املاک در حوزه ی شهری
- بیش از ۴۵ مورد استعمال و پاسخ به بانک ها
- بیش از ۱۰۰ مورد تعهد عقب نشینی
- بیش از ۱۰ مورد امور کسبه در سطح شهر
- بیش از ۳۰ مورد تفکیک اراضی در محدوده خدماتی شهر
- ۲۰ مورد معرفی ارباب رجوع به دفتر نظام مهندسی جهت تأیید استحکام بنا
- بیش از ۱۰ مورد رسیدگی به شکایات
- بیش از ۲۰ مورد نقشه برداری و تعیین حرائم
- پیگیری و اصلاح مشکلات طرح هادی شهر کامفیروز
- جلوگیری از ۳۰ مورد ساخت و سازهای غیر مجاز توسط پلیس ساختمان

پروانه های صادره

مقایسه آمار پروانه های ساختمانی صادره شهرداری کامفیروز

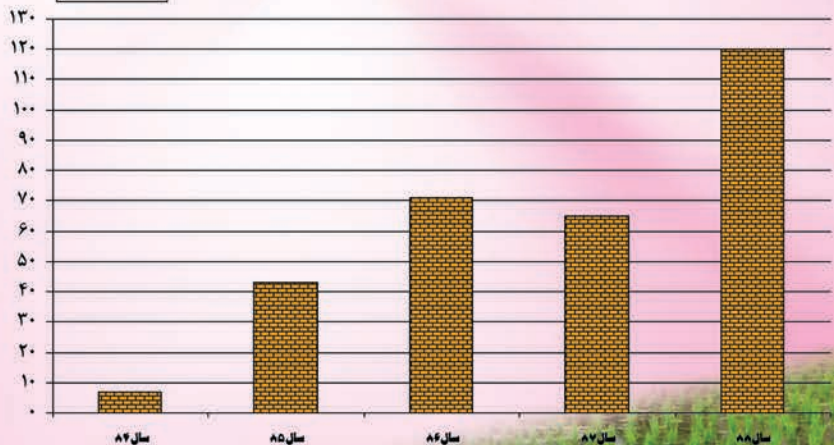

شهرداری کامفیروز



عملیات بیس ریزی



عملیات آسفالت

خیابان شهید نصیری

ردیف	عملیات انجام شده	واحد	حجم عملیات	اعتبار هزینه شده (ریال)
۱	باز کشایی معبر	متر مربع	۳۰	۴۵۰۰۰۰۰
۲	اجرای کانو بفل	-----	---	-----
۳	اجرای کانو وسط	متر	۱۰	۱۲۰۰۰۰۰
۴	رگلازو تسطیح اولیه	ساعت	۸	۱۲۰۰۰۰۰
۵	بیس ریزی	تن	۱۸۰	۶۶۶۰۰۰۰
۶	رگلازو تسطیح و کوبیدن بیس	ساعت	۱۰	۳۰۰۰۰۰۰
۷	عملیات قیر پاشی	متر مربع	۹۴۵	۶۴۲۶۰۰۰
۸	اجرای دال بتنی	-----	---	-----
۹	اجرای آسفالت	متر مربع	۹۴۵	۵۹۳۴۶۰۰۰
۱۰	آزمایشات بیس و آسفالت	نمونه	۳	۱۸۰۰۰۰۰

خیابان شهید نامدار




عملیات بیس ریزی



عملیات آسفالت

ردیف	عملیات انجام شده	واحد	حجم عملیات	اعتبار هزینه شده (ریال)
۱	باز کشایی معبر	متر مربع	۴۵	۶۷۵۰۰۰۰
۲	اجرای کانو بفل	-----	---	-----
۳	اجرای کانو وسط	متر	۶	۷۲۰۰۰۰۰
۴	رگلازو تسطیح اولیه	ساعت	۸	۱۱۲۰۰۰۰
۵	بیس ریزی	تن	۴۳۲	۱۵۹۸۴۰۰۰
۶	رگلازو تسطیح و کوبیدن بیس	ساعت	۹	۱۳۵۰۰۰۰
۷	عملیات قیر پاشی	متر مربع	۲۲۷۶	۱۵۴۷۶۸۰۰
۸	اجرای دال بتنی	عدد	۲	۵۰۰۰۰۰۰
۹	اجرای آسفالت	متر مربع	۲۲۷۶	۱۴۲۹۳۲۸۰۰
۱۰	آزمایشات بیس و آسفالت	نمونه	۵	۲۴۰۰۰۰۰



شهرداری کامفیروز



قبل از عملیات



بعد از عملیات

خیابان شهید دستغیب

ردیف	عملیات انجام شده	واحد	حجم عملیات	اعتبار هزینه شده (ریال)
۱	باز کشایی معبر	-----	-----	-----
۲	اجرای کانو بفل	-----	-----	-----
۳	اجرای کانو وسط	متر	۵	۶۰۰۰۰۰
۴	رگلازو تسطیح اولیه	ساعت	۵	۷۰۰۰۰۰
۵	بیس ریزی	تن	۲۲۸	۸۴۳۶۰۰۰
۶	رگلاز تسطیح و کوبیدن بیس	ساعت	۶	۹۰۰۰۰۰
۷	عملیات قیر پاشی	متر مربع	۱۲۰۰	۸۱۶۰۰۰۰
۸	اجرای دال بتنی	عدد	۲	۵۰۰۰۰۰
۹	اجرای آسفالت	متر مربع	۱۲۰۰	۷۵۳۶۰۰۰۰
۱۰	آزمایشات بیس و آسفالت	نمونه	۲	۱۸۰۰۰۰۰۰



قبل از عملیات



بعد از عملیات

خیابان اسفندیاری

ردیف	عملیات انجام شده	واحد	حجم عملیات	اعتبار هزینه شده (ریال)
۱	باز کشایی معبر	متر مربع	۶۰	۹۰۰۰۰۰۰
۲	اجرای کانو بفل	-----	-----	-----
۳	اجرای کانو وسط	متر	۸	۹۶۰۰۰۰
۴	رگلازو تسطیح اولیه	ساعت	۱۲	۱۶۸۰۰۰۰
۵	بیس ریزی	تن	۳۲۳	۱۱۹۵۱۰۰۰
۶	رگلاز تسطیح و کوبیدن بیس	ساعت	۸	۱۲۰۰۰۰۰
۷	عملیات قیر پاشی	متر مربع	۱۷۰۰	۱۱۵۶۰۰۰۰
۸	اجرای دال بتنی	عدد	۲	۵۰۰۰۰۰
۹	اجرای آسفالت	متر مربع	۱۷۰۰	۱۰۶۷۶۰۰۰۰
۱۰	آزمایشات بیس و آسفالت	نمونه	۵	۲۳۰۷۶۹۲

شهرداری کامفیروز

خیابان شهید قشقایی

ردیف	عملیات انجام شده	واحد	حجم عملیات	اعتبار هزینه شده (ریال)
۱	باز گشایی معبر	-----	-----	-----
۲	اجرای کانو بفل	-----	-----	-----
۳	اجرای کانو وسط	متر	۳	۳۶۰۰۰۰
۴	رگلازو تسطیح اولیه	ساعت	۴	۵۶۰۰۰۰
۵	بیس ریزی	تن	۱۳۸/۷	۵۱۳۱۹۰۰
۶	رگلاز تسطیح و گویدن بیس	ساعت	۵	۷۵۰۰۰۰
۷	عملیات قیر پاشی	متر مربع	۷۳۰	۴۹۶۴۰۰۰
۸	اجرای دال بتنی	عدد	۲	۵۰۰۰۰۰
۹	اجرای آسفالت	متر مربع	۷۳۰	۴۵۸۴۴۰۰۰
۱۰	آزمایشات بیس و آسفالت	نمونه	۱	۹۰۰۰۰۰

عملیات قیر پاشی



عملیات آسفالت

خیابان ۱۵ خرداد


ردیف	عملیات انجام شده	واحد	حجم عملیات	اعتبار هزینه شده (ریال)
۱	باز گشایی معبر	متر مربع	۴۵	۹۰۰۰۰۰۰
۲	اجرای کانو بفل	-----	-----	-----
۳	اجرای کانو وسط	متر	۱۰	۱۲۰۰۰۰۰
۴	رگلازو تسطیح اولیه	ساعت	۸	۱۱۲۰۰۰۰
۵	بیس ریزی	تن	۳۴۲	۱۲۶۵۴۰۰۰
۶	رگلاز تسطیح و گویدن بیس	ساعت	۸	۱۲۰۰۰۰۰
۷	عملیات قیر پاشی	متر مربع	۱۸۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰
۸	اجرای دال بتنی	عدد	۱	۲۵۰۰۰۰۰
۹	اجرای آسفالت	متر مربع	۱۸۰۰	۱۱۲۰۴۰۰۰۰
۱۰	آزمایشات بیس و آسفالت	نمونه	۲	۲۲۰۰۰۰۰

قبل از عملیات



بعد از عملیات

شهرداری کامفیروز

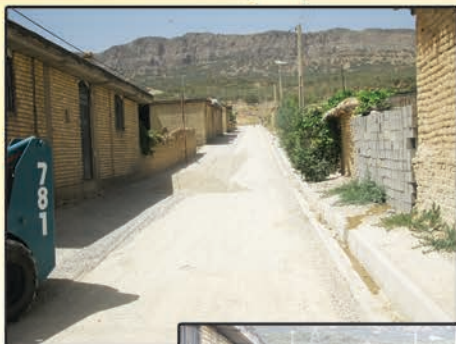

عملیات آسفالت



عملیات آسفالت



عملیات بیس ریزی

خیابان شهید عیدی پور

ردیف	عملیات انجام شده	واحد	حجم عملیات	اعتبار هزینه شده (ریال)
۱	باز کشایی معبر	-----	-----	-----
۲	اجرای کانو بفل	-----	-----	-----
۳	اجرای کانو وسط	متر	۱۰	۱۲۰۰۰۰۰
۴	رگلازو تسطیح اولیه	ساعت	۱۰	۱۴۰۰۰۰۰
۵	بیس ریزی	تن	۲۰۹	۷۷۴۳۰۰۰
۶	رگلازو تسطیح و کوبیدن بیس	ساعت	۱۰	۱۵۰۰۰۰۰
۷	عملیات قیر باشی	متر مربع	۱۱۰۰	۷۴۸۰۰۰۰
۸	اجرای دال بتنی	عدد	۲	۵۰۰۰۰۰۰
۹	اجرای آسفالت	مترمربع	۱۱۰۰	۶۹۰۸۰۰۰۰
۱۰	آزمایشات بیس و آسفالت	نمونه	۲	۱۸۰۰۰۰۰۰

خیابان شهید نامدار


ردیف	عملیات انجام شده	واحد	حجم عملیات	اعتبار هزینه شده (ریال)
۱	باز کشایی معبر	متر مربع	۸۰	۱۲۰۰۰۰۰۰
۲	اجرای کانو بفل	-----	-----	-----
۳	اجرای کانو وسط	متر	۲۰	۲۴۰۰۰۰۰
۴	رگلازو تسطیح اولیه	ساعت	۱۰	۱۴۰۰۰۰۰
۵	بیس ریزی	تن	۴۲۷	۱۵۷۹۹۰۰۰
۶	رگلازو تسطیح و کوبیدن بیس	ساعت	۱۵	۲۲۵۰۰۰۰
۷	عملیات قیر باشی	متر مربع	۲۲۵۰	۱۵۳۰۰۰۰۰
۸	اجرای دال بتنی	-----	-----	-----
۹	اجرای آسفالت	متر مربع	۲۶۵۰	۱۶۶۴۲۰۰۰۰
۱۰	آزمایشات بیس و آسفالت	نمونه	۵	۳۵۰۰۰۰۰۰

شهرداری کامفیروز

خیابان شقایق

ردیف	عملیات انجام شده	واحد	حجم عملیات	اعتبار هزینه شده (ریال)
۱	باز گشایی معبر	متر مربع	۴۰	۶۰۰۰۰۰
۲	اجرای کانوی بفل	-----	-----	-----
۳	اجرای کانوی وسط	-----	-----	-----
۴	رکلاژ و تسطیح اولیه	ساعت	۸	۱۱۲۰۰۰
۵	بیس ریزی	تن	۲۱۶/۶	۸۰۱۴۲۰۰
۶	رکلاژ و تسطیح و گویدن بیس	ساعت	۸	۱۲۰۰۰۰
۷	عملیات قبر پاشی	متر مربع	۱۱۴۰	۷۷۵۲۰۰۰
۸	اجرای دال بتنی	-----	-----	-----
۹	اجرای آسفالت	متر مربع	۱۱۴۰	۷۱۵۹۲۰۰۰
۱۰	آزمایشات بیس و آسفالت	نمونه	۲	۲۲۰۰۰۰

عملیات بیس ریزی

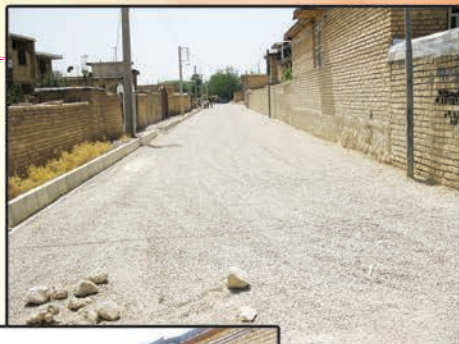


عملیات آسفالت


خیابان شورا

ردیف	عملیات انجام شده	واحد	حجم عملیات	اعتبار هزینه شده (ریال)
۱	باز گشایی معبر	متر مربع	۶۰	۹۰۰۰۰۰
۲	اجرای کانوی بفل	-----	-----	-----
۳	اجرای کانوی وسط	متر	۸	۹۶۰۰۰۰
۴	رکلاژ و تسطیح اولیه	ساعت	۱۰	۱۴۰۰۰۰۰
۵	بیس ریزی	تن	۳۶۰	۱۳۳۲۰۰۰۰
۶	رکلاژ و تسطیح و گویدن بیس	ساعت	۱۰	۱۵۰۰۰۰۰
۷	عملیات قبر پاشی	متر مربع	۱۸۹۰	۱۲۸۵۲۰۰۰
۸	اجرای دال بتنی	-----	-----	-----
۹	اجرای آسفالت	متر مربع	۱۸۹۰	۱۱۸۶۹۲۰۰۰
۱۰	آزمایشات بیس و آسفالت	نمونه	۳	۲۸۰۰۰۰۰

عملیات بیس ریزی

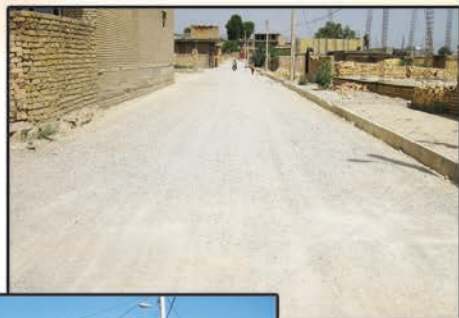

عملیات آسفالت



شهرداری کامفیروز

خیابان شمیم



قبل از عملیات



بعد از عملیات

ردیف	عملیات انجام شده	واحد	حجم عملیات	اعتبار هزینه شده (ریال)
۱	باز کشایی معبر	متر مربع	۴۰	۶۰۰۰۰۰
۲	اجرای کانو بفل	---	---	---
۳	اجرای کانو وسط	---	---	---
۴	رگلاز و تسطیح اولیه	ساعت	۸	۱۱۲۰۰۰۰
۵	بیس ریزی	تن	۱۸۶/۲	۶۸۸۹۴۰۰
۶	رگلاز و تسطیح و گویندن بیس	ساعت	۸	۱۲۰۰۰۰۰
۷	عملیات قیر پاشی	متر مربع	۹۸۰	۶۶۶۴۰۰۰
۸	اجرای دال بتنی	---	---	---
۹	اجرای آسفالت	متر مربع	۹۸۰	۶۱,۵۵۴,۰۰۰
۱۰	آزمایشات بیس و آسفالت	نمونه	۲	۲۲۰۰۰۰۰/۶۱۵۵۴۰۰۰

خیابان ۲۲ بهمن



قبل از عملیات



بعد از عملیات

ردیف	عملیات انجام شده	واحد	حجم عملیات	اعتبار هزینه شده (ریال)
۱	باز کشایی معبر	---	---	---
۲	اجرای کانو بفل	---	---	---
۳	اجرای کانو وسط	---	---	---
۴	رگلاز و تسطیح اولیه	ساعت	۵	۷۰۰۰۰۰
۵	بیس ریزی	تن	۱۰۶	۳۹۳۶۸۰۰
۶	رگلاز و تسطیح و گویندن بیس	ساعت	۵	۷۵۰۰۰۰
۷	عملیات قیر پاشی	متر مربع	۵۶۰	۳۸۰۸۰۰۰
۸	اجرای دال بتنی	---	---	---
۹	اجرای آسفالت	متر مربع	۵۶۰	۳۵۱۶۸۰۰۰
۱۰	آزمایشات بیس و آسفالت	نمونه	۱	۱۲۰۰۰۰۰



شهرداری کامفیروز

خیابان رهبری

ردیف	عملیات انجام شده	واحد	حجم عملیات	اعتبار هزینه شده (ریال)
۱	باز کشایی معبر	-----	۷۰	۱۰۵۰۰۰۰
۲	اجرای کانویو نقل	-----	-----	-----
۳	اجرای کانویو وسط	-----	-----	-----
۴	رگلازو تسطیح اولیه	ساعت	۱۰	۱۴۰۰۰۰
۵	بیس ریزی	تن	۲۷۴,۵۵	۱۰۱۵۸۳۵۰
۶	رگلاز تسطیح و گویندن بیس	ساعت	۱۰	۱۵۰۰۰۰
۷	عملیات قیر پاشی	متر مربع	۱۰۴۴۵	۹۸۲۶۰۰۰
۸	اجرای دال بتنی	-----	-----	-----
۹	اجرای آسفالت	متر مربع	۱۴۴۵	۹۰۷۴۶۰۰۰
۱۰	آزمایشات بیس و آسفالت	نمونه	۲	۲۴۰۰۰۰۰

عملیات قیر پاشی



عملیات آسفالت


خیابان بسیج

ردیف	عملیات انجام شده	واحد	حجم عملیات	اعتبار هزینه شده (ریال)
۱	باز کشایی معبر	-----	-----	-----
۲	اجرای کانویو نقل	-----	-----	-----
۳	اجرای کانویو وسط	-----	-----	-----
۴	رگلازو تسطیح اولیه	ساعت	۱۲	۱۶۸۰۰۰۰
۵	بیس ریزی	تن	۳۶۱	۱۳۳۵۷۰۰۰
۶	رگلاز تسطیح و گویندن بیس	ساعت	۱۲	۱۸۰۰۰۰۰
۷	عملیات قیر پاشی	متر مربع	۱۹۰۰	۱۲۹۲۰۰۰۰
۸	اجرای دال بتنی	عدد	۲	۵۰۰۰۰۰
۹	اجرای آسفالت	متر مربع	۱۹۰۰	۱۱۹۳۲۰۰۰۰
۱۰	آزمایشات بیس و آسفالت	نمونه	۳	۳۶۰۰۰۰۰

عملیات بیس ریزی



عملیات آسفالت



شهرداری کامفیروز

عملیات اجرایی در فاز ۲ بلوار خلیج فارس

ردیف	عملیات انجام شده	واحد	حجم عملیات	نحوه اجرا	اعتبار هزینه شده (ریال)
۱	اجرای کوه بری و کوه برداری در دو مرحله	متر مکعب	۳۰,۰۰۰	امانی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲	حذف نقاط حادثه خیز و مخلوط ریزی	متر مکعب	۲۰,۰۰۰	امانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	اجرای جدول دو طرف باند	متر	۸۹۰	امانی	۲۳۱,۴۰۰,۰۰۰
۴	اجرای رفوژ وسط بلوار	متر	۸۵۰	امانی	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	تخریب و محل آسفالت قدیمی	متر مکعب	۳۱۶۸	امانی	۴۳۶۰۰۰۰۰
۶	اجرای مخلوط ریزی دو طرف باند	متر مکعب	۲۶۷۰۰	پیمانی	۸۶۸۵۵۰۰۰
۷	قیر پاشی	متر مربع	۱۰۲۹۳	پیمانی	۶۹۰۲۲۵۰۰
۸	اجرای آسفالت	متر مربع	۱۰۲۹۳	پیمانی	۷۳۲۳۰۶۰۰۰
۹	خاک نباتی وسط بلوار	متر مکعب	۳۴۰۰	امانی	۱۰۶۵۰۰۰۰۰
۱۰	نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی	عدد	۱۶	امانی	۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۱	نصب علائم چشم گربه ای	عدد	۲۰۰	امانی	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲	رنگ آمیزی رفوژه وسط	متر مربع	۴۵۰	امانی	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	اجرای فونداسیون چراغهای برق و روشنایی بلوار	عدد	۱۳	امانی	۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴	اجرای فضای سبز دو طرف باند	متر مربع	۱۸۰۰	امانی	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵	اجرای فضای سبز رفوژ وسط	متر مربع	۱۸۰۰	امانی	۱۰۰۰۰۰۰۰۰

